




Jour Fixe 4 - 12.06.2024

Softwareentwicklungsprojekt

Vortragender: Enes Ekincioğlu

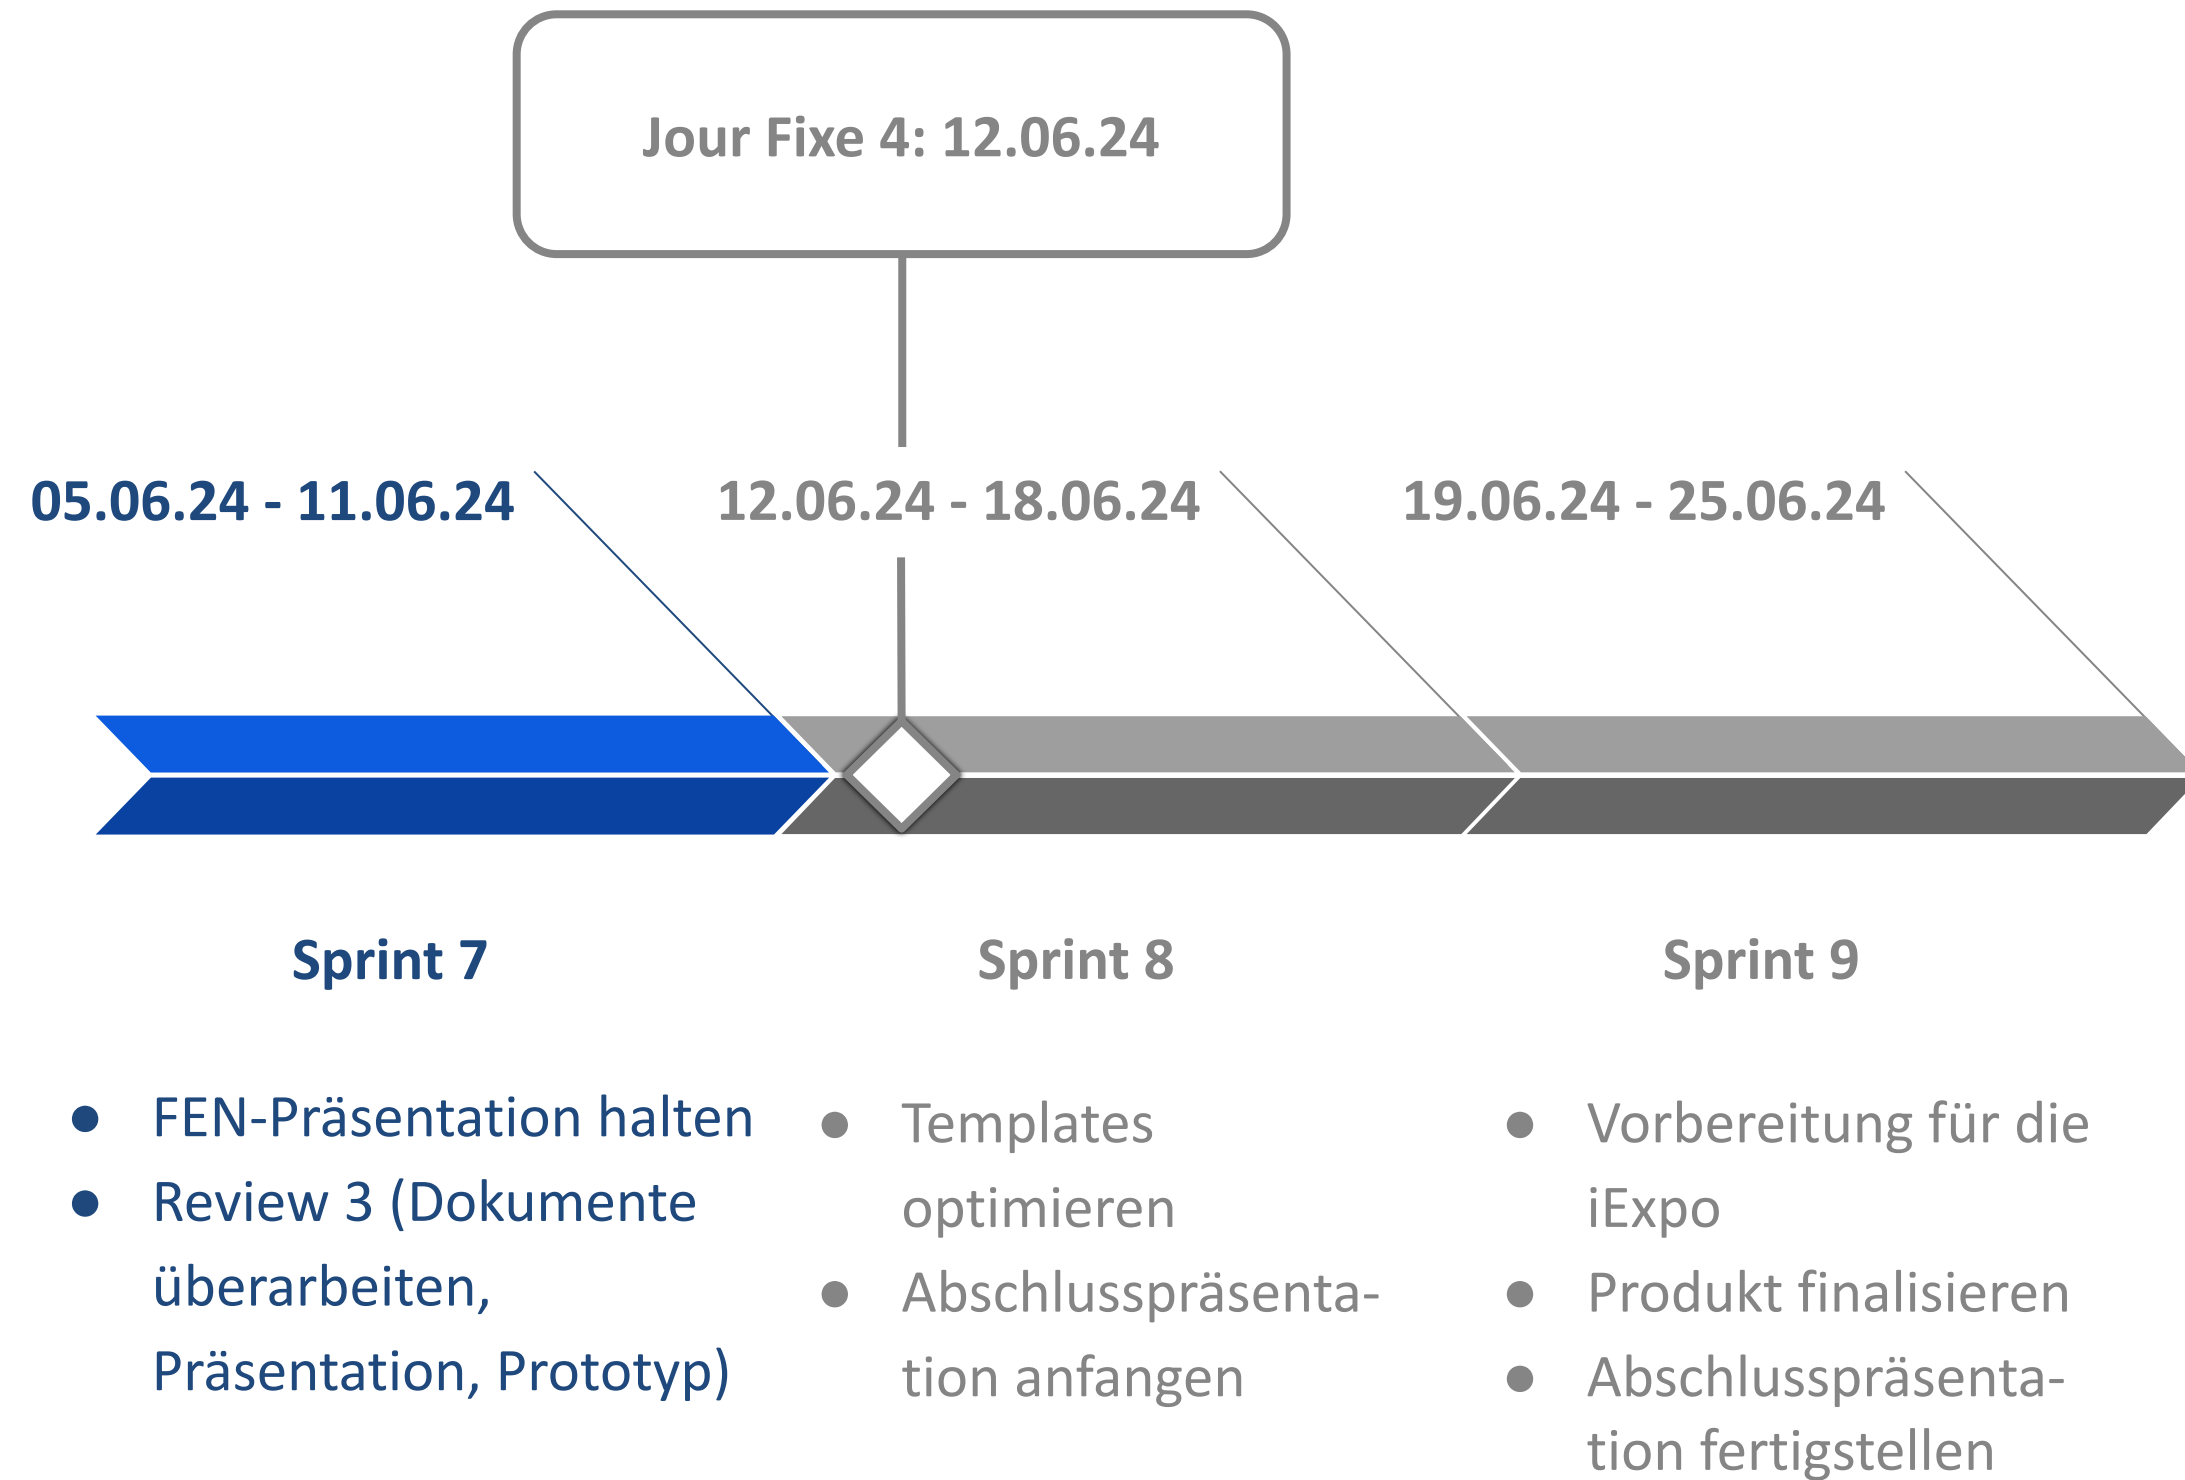

Sprint 7-Innenausbau Teil 2

05.06.24 - 11.06.24

Angaben in ph

Kategorie	Arbeitspaket	soll	ist	Differenz	Status
Organisation	- Sprint Planning	6	6	0	✓
	- Sprint Retrospektive	3	3	0	✓
	- Daily Scrum	5	5	0	✓
Dokumentation	- Projektdokumente überarbeiten	9	8	-1	✓
	- Jour Fixe 4 anfertigen	15	14	-1	✓
	- Template Testdokument erstellen	13	4	-9	📋 (9)
Entwicklung	- Neue Templates nur mit CSS erstellen	50	40	-10	✓
	- Code-Qualitätssicherung	18	18	0	✓
	- Bug fixing	14	15	+1	✓
	- Neue AI-Modelle testen	10	12	+2	✓
	- Team Website überarbeiten	4	5	+1	✓
	- Kundenserver einrichten ↻	4	6	+2	✓
	- Formerstellung mit API config durch Library, anstatt mit AI *	0	10	+10	✓
Pflichttermine	- FEN-Präsentation halten	24	25	+1	✓
	- Review 3 halten	18	19	+1	✓
	- Nachbesprechung von Review 3 mit Dozent	6	4	-2	✓
	- Peer-Review	4	4	0	✓
Summe	5d * 7ph * 6p - 1d * 7ph * 1p = 203	203	198	-5	

05.06.24 - 11.06.24

Herausforderung	Lösung
Sprint 7: • Passende Templates erstellen, welche den Anforderungen des Kunden entsprechen	Sprint 7: • Recherchieren, testen und anpassen, um passende Templates zu erstellen

Sprint 8-Fenster Installation

12.06.24 - 18.06.24

Angaben in ph

Kategorie	Arbeitspaket	soll	ist	Differenz	Status
Organisation	- Sprint Planning - Sprint Retrospektive - Daily Scrum - Kunden Meeting	5 3 5 3	- - - -	- - - -	- - - -
Dokumentation	- Projektdokumente überarbeiten - Review 4 anfertigen - Abschlusspräsentation anfangen - Template Test-Dokument erstellen ↻ - iExpo Poster konzeptionieren	8 20 20 9 3	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Entwicklung	- Bug-fixing - Template-Optimierung - At Fetch aus Liste im Back-End erstellen lassen - Chat Historie einbinden - Section Auswahl für Chatbot - Umsetzung Kundenfeedback - Produktwebsite ausbessern	13 40 16 6 8 21 4	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
Pflichttermine	- Jour Fixe 4 - Nachbesprechung von Jour Fixe 4 mit Dozent	15 4	- -	- -	- -
Summe	5d * 7ph * 6p - 1d * 7ph * 1p = 203	203	-	-	

Risiko:

Änderungen am Produkt gefallen dem Kunden nicht

Indikator:


Negatives Kundenfeedback am 13.06.24

Präventiv:

Zeit einplanen um mögliche Änderungen umzusetzen

Reaktiv:

Kundenwünsche nach Erhalt des Feedbacks evaluieren und wenn möglich umsetzen.

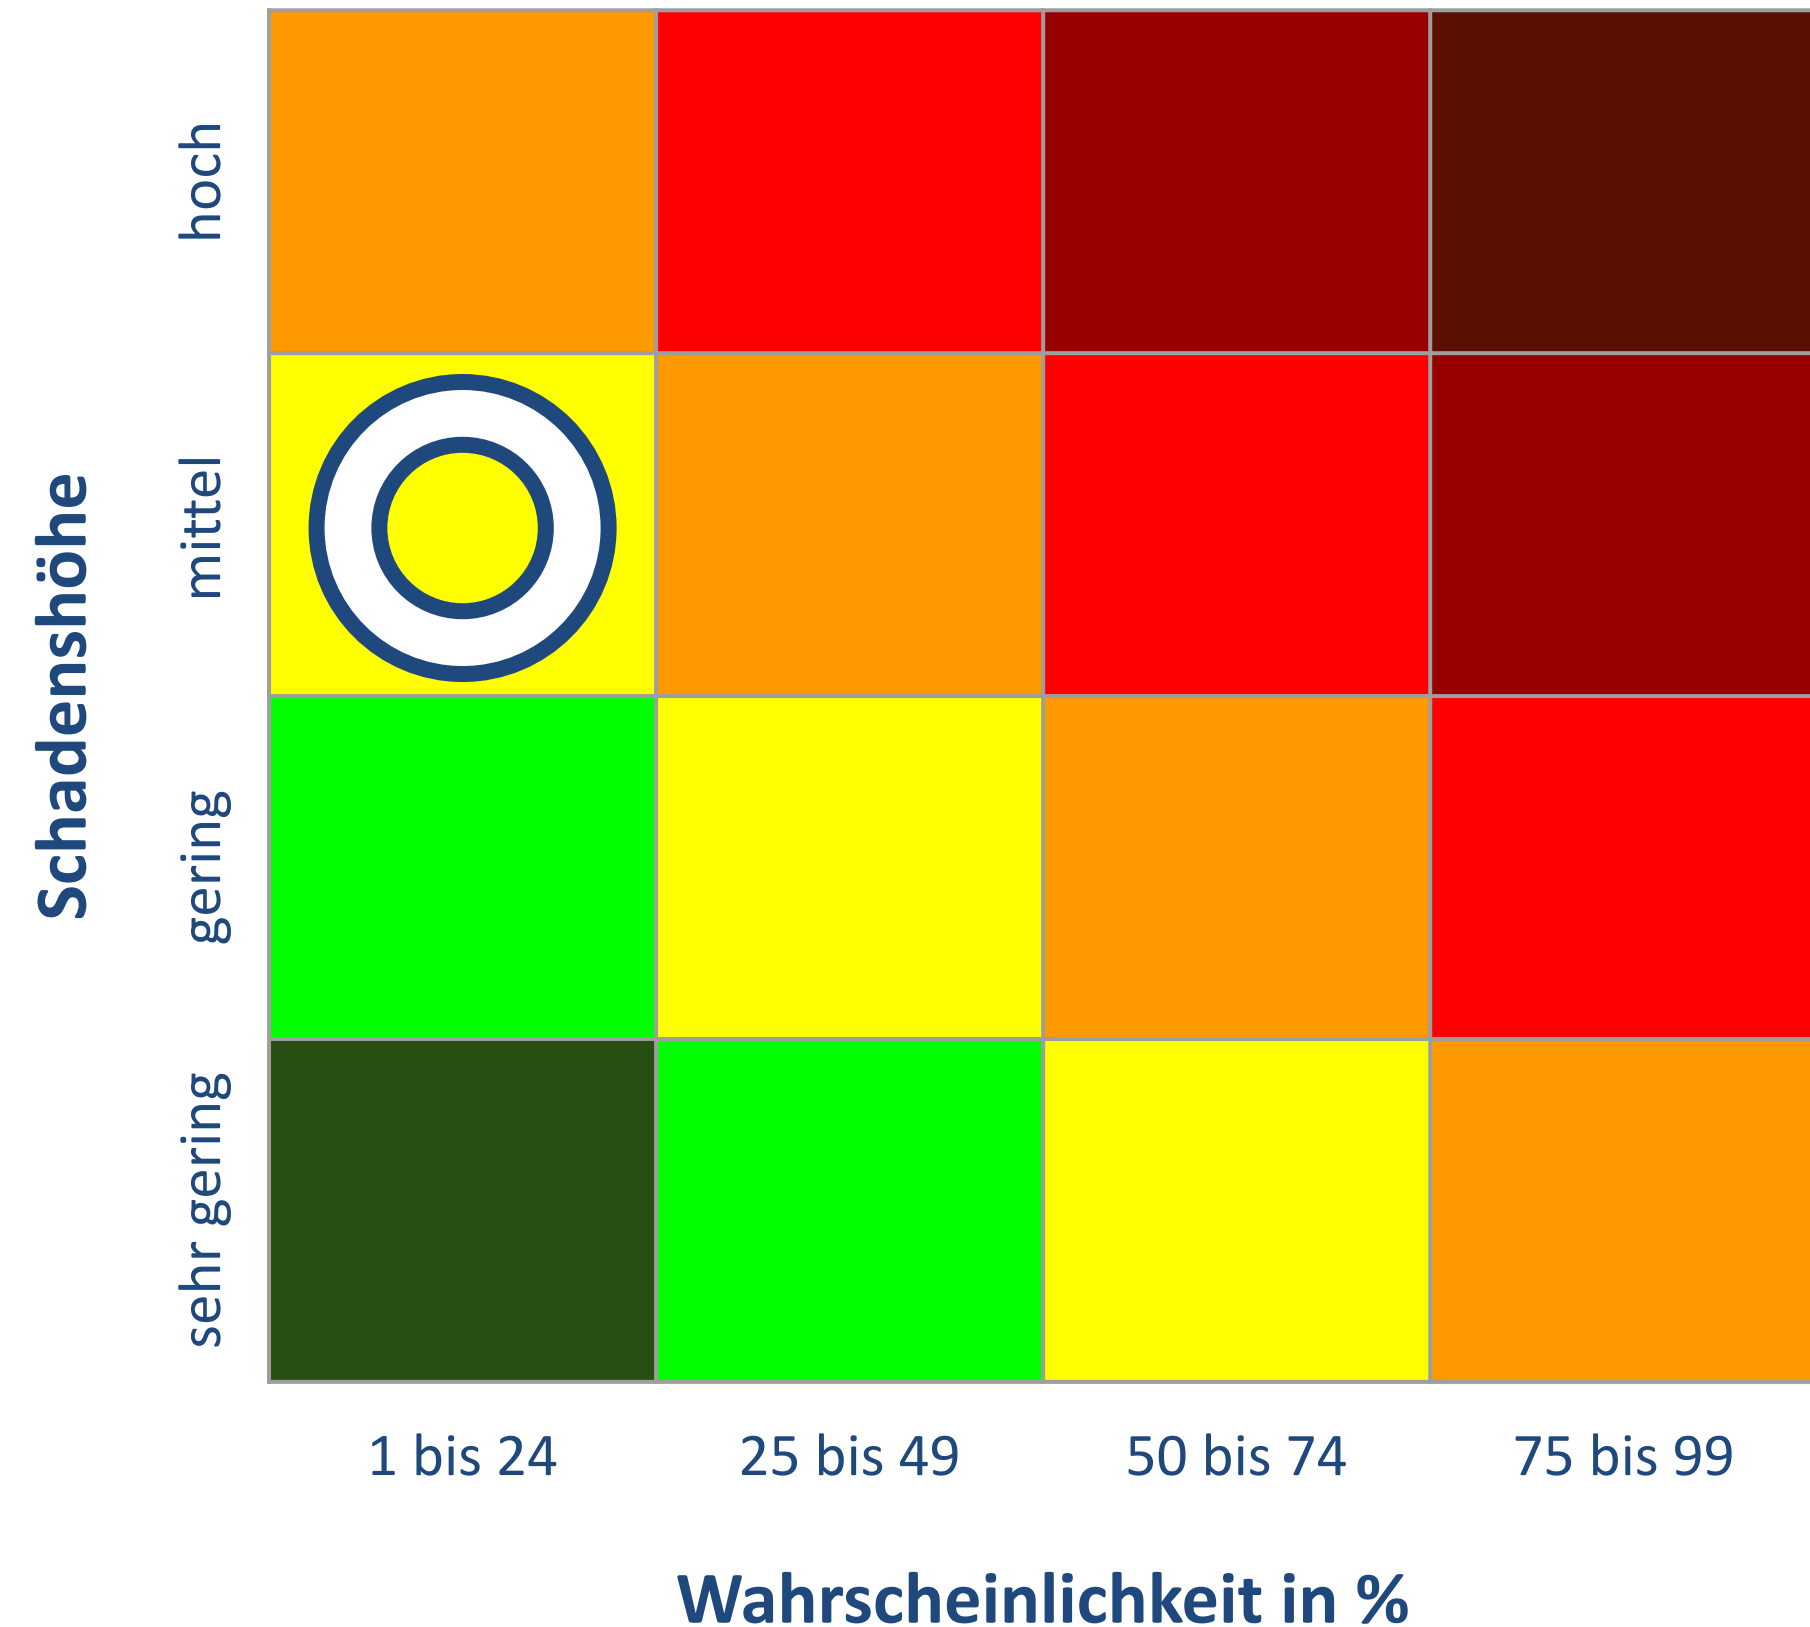

- Fachenglisch:
 - QA-Dokument abgegeben
 - FEN-Präsentation bestanden
- Produkt:
 - HTML Templates mit CSS, statt mit Bootstrap erstellt

